Proyecto: Tratamiento de Aguas Servidas de Doe Run Peru
" SEWAGE"

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1	**TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS**	**640 días**	**mié 12/8/04**	**sáb 12/23/06**
2	**Estaciones de bombeo**	**164 días**	**vie 7/1/05**	**sáb 1/7/06**
3	**EB -4 de Huaymanta**	**129 días**	**vie 7/1/05**	**lun 11/28/05**
4	Expediente técnico - Equipos	26 días	vie 7/1/05	sáb 7/30/05
5	Compra hasta Oroya	75 días	lun 8/1/05	jue 11/10/05
6	Instalación	15 días	vie 11/11/05	lun 11/28/05
7	**EB -1, EB - 2 EB - 3 y EB5 Chulec/Fund**	**137 días**	**mar 8/2/05**	**sáb 1/7/06**
8	Expediente técnico	7 días	mar 8/2/05	mar 8/9/05
9	Compra hasta Oroya	90 días	mié 8/10/05	mar 11/22/05
10	Instalación	40 días	mié 11/23/05	sáb 1/7/06
11	**Instalación de colectores**	**371 días**	**mié 12/8/04**	**lun 2/13/06**
12	**Colector Chulec**	**195 días**	**jue 1/13/05**	**sáb 8/27/05**
19	**Colector Huaymanta**	**175 días**	**mié 12/8/04**	**mié 6/29/05**
20	**Aguas de Refrigeración**	**150 días**	**mié 12/8/04**	**mar 5/31/05**
26	**Aguas de Servidas**	**15 días**	**dom 6/12/05**	**mié 6/29/05**
33	**Colector Su dete -Inca**	**139 días**	**lun 9/5/05**	**lun 2/13/06**
34	Excavaciones	81 días	lun 9/5/05	mié 12/7/05
35	Instalación de tuberías	97 días	mié 9/28/05	mié 1/18/06
36	Buzones	65 días	lun 10/17/05	vie 12/30/05
37	Compactación	84 días	lun 10/31/05	sáb 2/4/06
38	Repavimentado	7 días	lun 2/6/06	lun 2/13/06
39	Entrega del proyecto	0 días	lun 2/13/06	lun 2/13/06
40	**Instalación de plantas modulares**	**480 días**	**lun 6/13/05**	**sáb 12/23/06**
41	**Fabricación de plantas**	**141 días**	**lun 6/13/05**	**mié 11/23/05**
42	Fabricación en Chile	11 días	lun 6/13/05	vie 6/24/05
43	Envío a La Oroya	28 días	lun 6/13/05	jue 7/14/05
44	Recibido en La Oroya	0 días	sáb 7/16/05	sáb 7/16/05
45	Equipo eléctrico	75 días	lun 8/29/05	mié 11/23/05
46	**Obras civiles**	**246 días**	**lun 6/13/05**	**sáb 3/25/06**
47	**Planta de Huaymanta**	**147 días**	**lun 6/13/05**	**mié 11/30/05**
48	Expediente técnico	5 días	lun 6/13/05	vie 6/17/05
49	Cotización y evaluación de proveedor	43 días	sáb 6/18/05	sáb 8/6/05
50	Obra en campo	93 días	lun 8/15/05	mié 11/30/05
51	Entrega de obras civiles	0 días	mié 11/30/05	mié 11/30/05
52	**Planta de Chulec**	**123 días**	**sáb 8/20/05**	**mié 1/11/06**
53	Expediente técnico	24 días	sáb 8/20/05	vie 9/16/05
54	Cotización y evaluación de proveedor	22 días	lun 9/26/05	jue 10/20/05
55	Obra en campo	65 días	vie 10/21/05	mié 1/4/06
56	Entrega de obras civiles	0 días	mié 1/11/06	mié 1/11/06
57	**Planta Fundición**	**168 días**	**lun 9/12/05**	**sáb 3/25/06**
58	Expediente técnico	15 días	lun 9/12/05	mié 9/28/05
59	Cotización y evaluación de proveedor	13 días	vie 10/7/05	vie 10/21/05
60	Obra en campo	132 días	lun 10/24/05	sáb 3/25/06
61	Entrega de obras civiles	0 días	sáb 3/25/06	sáb 3/25/06
62	**Instalación de plantas**	**364 días**	**mié 10/26/05**	**sáb 12/23/06**
63	**Huaymanta**	**205 días**	**mié 10/26/05**	**mié 6/21/06**
64	Instalación de equip. Mecánico	46 días	mié 10/26/05	sáb 12/17/05
65	Instalación de equip. Eléctrico	27 días	lun 12/12/05	mié 1/11/06
66	Star up	18 días	jue 1/12/06	mié 2/1/06
67	Pruebas	120 días	jue 2/2/06	mié 6/21/06
68	**Chulec**	**229 días**	**lun 1/30/06**	**lun 10/23/06**
69	Instalación de equip. Mecánico	72 días	lun 1/30/06	sáb 4/22/06
70	Instalación de equip. Eléctrico	40 días	mié 4/12/06	sáb 5/27/06
71	Star up	7 días	lun 5/29/06	lun 6/5/06
72	Pruebas	120 días	mar 6/6/06	lun 10/23/06
73	**Fundición**	**234 días**	**lun 3/27/06**	**sáb 12/23/06**
74	Instalación de equipamiento mecnico	102 días	lun 3/27/06	sáb 7/22/06
75	Instalación de equip. Eléctrico	40 días	mié 7/12/06	sáb 8/26/06
76	Star up	30 días	lun 8/28/06	sáb 9/30/06
77	Pruebas	72 días	lun 10/2/06	sáb 12/23/06
78	**Entrega del proyecto**	0 días	sáb 12/23/06	sáb 12/23/06

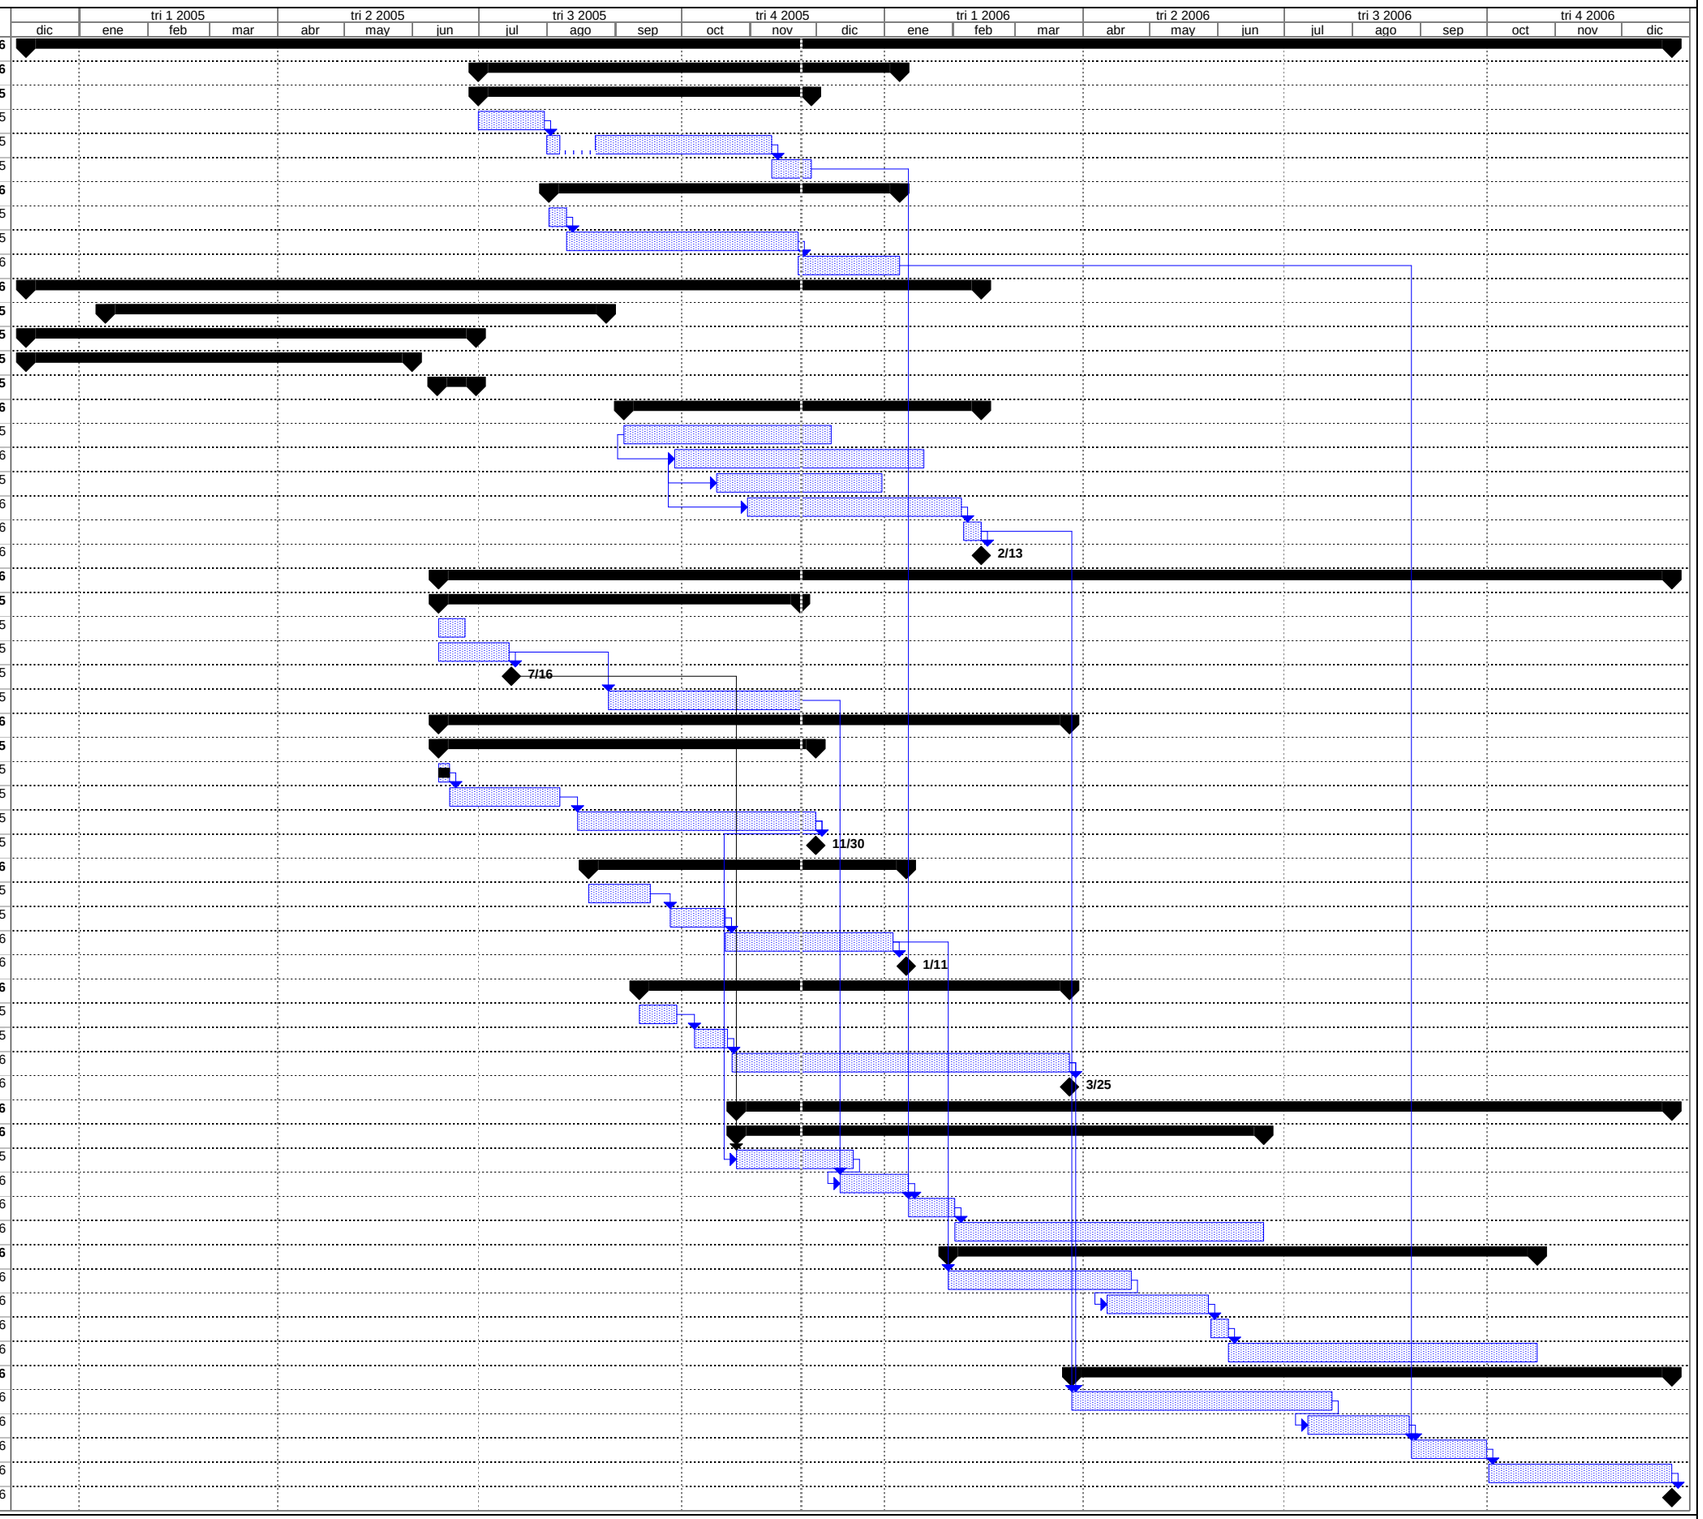

Proyecto: Sewage_2005_2006_modo9
Fecha: jue 11/24/05

Tarea | Progreso | Resumen | Tareas externas | Hito externo
División | Hito | Resumen del proyecto | Hito externo | Fecha límite
