PROYECTOS DE REDUCCION DE EMISIONES FUGITIVAS

Id	Task Name	Duración	Comienzo	Fin
1	**Reducción de emisiones fugitivas**	**55.08 sems**	**mié 11/2/05**	**sáb 12/23/06**
2	Inicio	0 sems	mié 11/2/05	mié 11/2/05
3	**AFE 007-05 1000 SCFM Compresor**	**41 sems**	**mié 11/2/05**	**vie 9/8/06**
4	Compra de Equipos y tuberías	24 sems	mié 11/2/05	jue 4/27/06
5	Instalación	16 sems	jue 4/27/06	mar 8/29/06
6	Arranque	1 sem	mar 8/29/06	vie 9/8/06
7	**AFE 015-05 Ventilación Planta de Sinterización Pb**	**40 sems**	**mié 11/2/05**	**mar 8/29/06**
8	**Sistema A**	**40 sems**	**mié 11/2/05**	**mar 8/29/06**
9	BHA Compra-fabircación-entrega de Ventilador	24 sems	mié 11/2/05	jue 4/27/06
10	DRP Instalacion del ventilador	8 sems	jue 4/27/06	mar 6/27/06
11	DRP Reubicacion de lavador de gases - A	8 sems	mar 6/27/06	mar 8/29/06
12	BHA Fabricacion de componenetes	8 sems	mié 11/2/05	jue 12/29/05
13	BHA Embarque	4 sems	jue 12/29/05	sáb 1/28/06
14	DRP Ingeniería - Fabricación - Instalación	4 sems	sáb 1/28/06	mar 2/28/06
15	**Sistema B**	**26.15 sems**	**mié 11/2/05**	**lun 5/15/06**
16	BHA Fabricación componentes	6 sems	mié 11/2/05	jue 12/15/05
17	BHA Embarque	4 sems	vie 12/16/05	sáb 1/14/06
18	DRP Ingeniería - Fabricación - Instalación	4 sems	sáb 1/14/06	lun 2/13/06
19	DRP Fabricación de Colectores y Trabajos en ductería	8 sems	lun 2/13/06	jue 4/13/06
20	DRP Reubicacion de lavador de gases - B	4 sems	jue 4/13/06	lun 5/15/06
21	**Sistema C**	**22 sems**	**mié 11/2/05**	**mié 4/12/06**
22	BHA Ingeniería	6 sems	mié 11/2/05	jue 12/15/05
23	Fabricación	8 sems	jue 12/15/05	sáb 2/11/06
24	BHA Compra de Componentes	6 sems	jue 12/15/05	sáb 1/28/06
25	BHA Embarque	4 sems	sáb 1/28/06	mar 2/28/06
26	Instaación de componentes BHA por DRP	6 sems	mar 2/28/06	mié 4/12/06
27	**Sistema D**	**22 sems**	**mié 11/2/05**	**mié 4/12/06**
28	BHA Ingeniería	6 sems	mié 11/2/05	jue 12/15/05
29	DRP Fabricación	8 sems	jue 12/15/05	sáb 2/11/06
30	BHA Compra de componenetes	6 sems	jue 12/15/05	sáb 1/28/06
31	BHA Embarque	4 sems	sáb 1/28/06	mar 2/28/06
32	Instaación de componentes BHA por DRP	6 sems	mar 2/28/06	mié 4/12/06
33	**Ductwork**	**28 sems**	**mié 11/2/05**	**sáb 5/27/06**
34	BHA Ingeniería y rediseño - sistemas A,B,C	8 sems	mié 11/2/05	jue 12/29/05
35	DRP Fabricación	6 sems	jue 12/29/05	sáb 2/11/06
36	DRP Instalación	14 sems	sáb 2/11/06	sáb 5/27/06
37	**AFE 016-05 Encerramiento y Ventilación**	**36 sems**	**mié 11/2/05**	**mar 8/1/06**
38	**Planta de Espumaje**	**36 sems**	**mié 11/2/05**	**mar 8/1/06**
39	**Instalación de colectores**	**6 sems**	**mié 11/2/05**	**jue 12/15/05**
40	Compresor de Aire	6 sems	mié 11/2/05	jue 12/15/05
41	Sistema de ventailacion localizado para Ollas de PlomoBHA	6 sems	mié 11/2/05	jue 12/15/05
42	**Encerramiento Edificio de Planta de Espumaje**	**4 sems**	**mar 6/27/06**	**mar 8/1/06**
43	Instalación	4 sems	mar 6/27/06	mar 8/1/06
44	**Ventilación Ollas de Espumaje**	**36 sems**	**mié 11/2/05**	**mar 8/1/06**
45	BHA Ingeniería	4 sems	mié 11/2/05	mié 11/30/05
46	DRP Fabricación y trabajos en ducterías y campanas	8 sems	mié 11/30/05	sáb 1/28/06
47	DRP Instalacion de ductería y campanas	20 sems	sáb 1/28/06	mar 6/27/06
48	Campanas de ollas y trabajos de ductería	4 sems	mar 6/27/06	mar 8/1/06

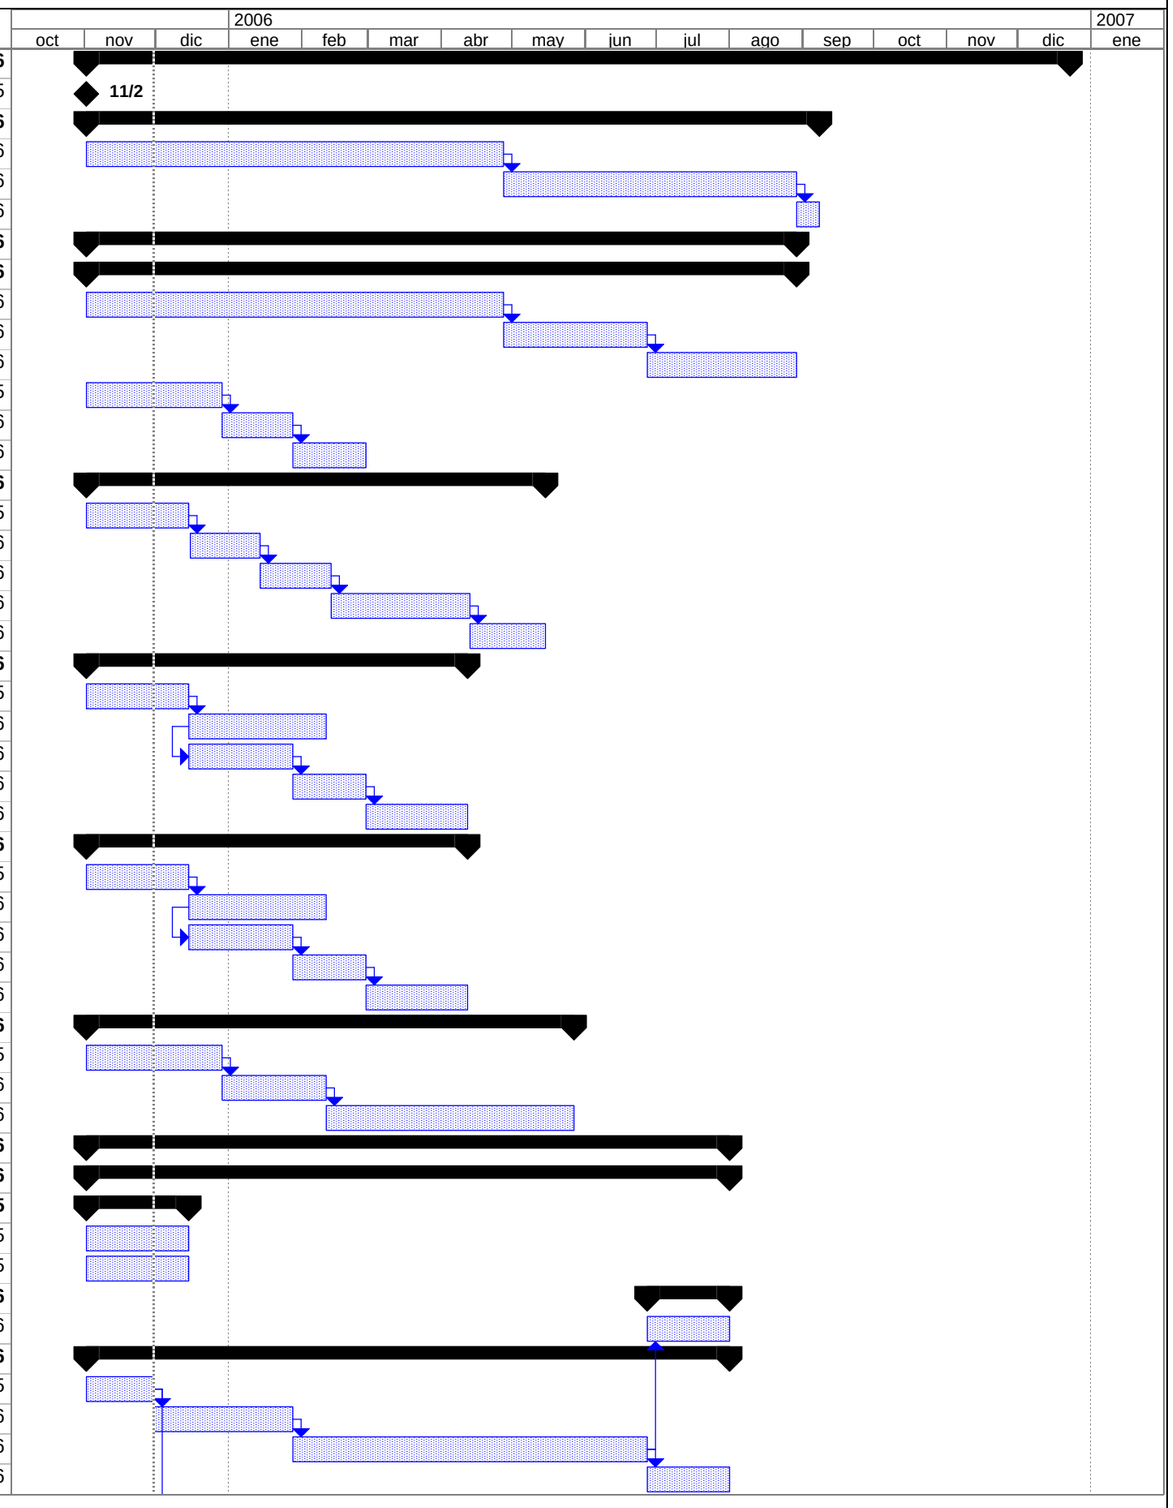

Project: ANEXO 7_E - PAMA 09 - REI
Date: mié 11/30/05

Task | Progress | Summary | External Tasks | External Milestone | Fecha límite
Split | Milestone | Project Summary | External Milestone | Hito externo

PROYECTOS DE REDUCCION DE EMISIONES FUGITIVAS

Id	Task Name	Duración	Comienzo	Fin
49	BHA Compra y fabricación de compuertas	8 sems	mié 11/30/05	sáb 1/28/06
50	BHA Embarque	4 sems	sáb 1/28/06	mar 2/28/06
51	DRP Instalación de compuertas	4 sems	mar 2/28/06	mar 3/28/06
52	**Transportador de tornillo**	**24 sems**	**mié 11/2/05**	**jue 4/27/06**
53	BHA Ingeniería	6 sems	mié 11/2/05	jue 12/15/05
54	DRP Compra	2 sems	jue 12/15/05	jue 12/29/05
55	DRP Fabricación de plataformas	8 sems	jue 12/29/05	mar 2/28/06
56	DRP Instalación de transportadores y plataformas	8 sems	mar 2/28/06	jue 4/27/06
57	**Horno de Plomo**	**24 sems**	**mié 11/2/05**	**jue 4/27/06**
58	**Instalación de colectores**	**6 sems**	**mié 11/2/05**	**jue 12/15/05**
59	DRP Instralación final de colectores	6 sems	mié 11/2/05	jue 12/15/05
60	DRP Compresor de aire	6 sems	mié 11/2/05	jue 12/15/05
61	**Encerramiento del edificio**	**12 sems**	**mié 11/30/05**	**mar 2/28/06**
62	DRP Fabricación e instalacion de encerramiento	12 sems	mié 11/30/05	mar 2/28/06
63	**Transportador de tornillo**	**24 sems**	**mié 11/2/05**	**jue 4/27/06**
64	Ingeniería de transporte de polvo hacia el horno	24 sems	mié 11/2/05	jue 4/27/06
65	Compra e instalacion de sistemas de trasnporte	24 sems	mié 11/2/05	jue 4/27/06
66	**AFE 017-05 Encerramiento lateral de camas de plomo**	**55 sems**	**mié 11/2/05**	**vie 12/22/06**
67	Estudio de opciones	4 sems	mié 11/2/05	mié 11/30/05
68	Presentacion de estudios	4 sems	mié 11/30/05	jue 12/29/05
69	DRP Revision de opciones y toma de decisión	4 sems	mié 11/30/05	jue 12/29/05
70	Compra de materiales - selección contartista - Entrega de materiale	12 sems	jue 12/29/05	mar 3/28/06
71	Construcción	35 sems	mar 3/28/06	vie 12/22/06
72	**AFE 018-05 Lavador de gases nitrosos**	**55 sems**	**mié 11/2/05**	**vie 12/22/06**
73	Estudio	4 sems	mié 11/2/05	mié 11/30/05
74	Presentacion de estudios	4 sems	mié 11/30/05	jue 12/29/05
75	DRP Revision de estudios y selección de alternativa	4 sems	mié 11/30/05	jue 12/29/05
76	Compra del lavador de gases	16 sems	jue 12/29/05	jue 4/27/06
77	Construcción	31 sems	jue 4/27/06	vie 12/22/06
78	**AFE 019-05 Encerramiento de las cams de Cobre**	**55 sems**	**mié 11/2/05**	**vie 12/22/06**
79	Estudio de opciones	4 sems	mié 11/2/05	mié 11/30/05
80	Presentacion de estudios	4 sems	mié 11/30/05	jue 12/29/05
81	DRP Revision de estudios y selección de alternativa	4 sems	mié 11/30/05	jue 12/29/05
82	Compra de materiales - selección contratista - Entrega de materiales	12 sems	jue 12/29/05	mar 3/28/06
83	Construcción	35 sems	mar 3/28/06	vie 12/22/06
84	**AFE 020-05 Residuos Anódicos**	**55.08 sems**	**mié 11/2/05**	**sáb 12/23/06**
85	**Colector de polvo para ventilacion de edificioBuilding ventilatio**	**55.08 sems**	**mié 11/2/05**	**sáb 12/23/06**
86	BHA Ingeniería	4 sems	mié 11/2/05	mié 11/30/05
87	BHA propuesta	4 sems	mié 11/30/05	jue 12/29/05
88	BHA Compra - fabricacio y embarque	25 sems	vie 12/30/05	sáb 7/8/06
89	DRP Montaje (Obras Civiles, mecánicas y eléctricas)	22 sems	sáb 7/8/06	sáb 12/23/06
90	Fin	0 sems	vie 1/5/07	vie 1/5/07

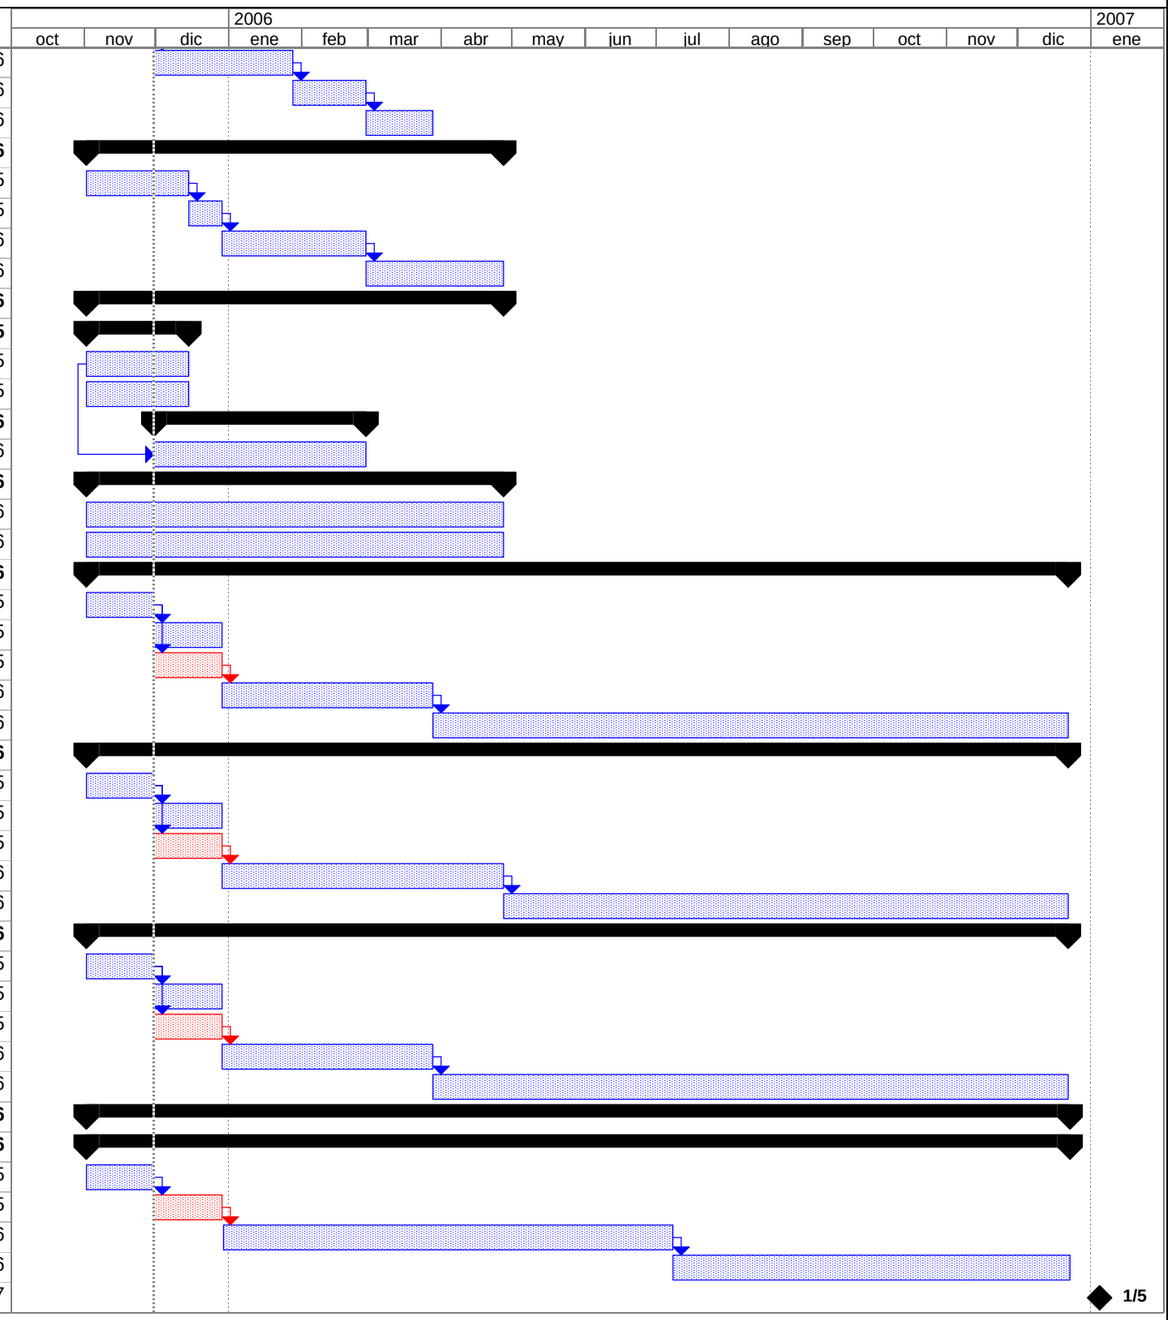

Project: ANEXO 7_E - PAMA 09 - REI
Date: mié 11/30/05

Task | Progress | Summary | External Tasks | External Milestone | Fecha límite
Split | Milestone | Project Summary | External Milestone | Hito externo
